

세지지구 배수개선사업

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	15,410	
○		○					○	○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	100%
			○								

❖ 정책목표: 영농불편 해소 및 마을 환경 개선


□ 현황 및 정책개요

○ 사업 현황

- 위 치 : 나주시 세지면 송제리 외 4개리 일원
- 사 업 량 : 배수장 신설 1개소, 배수로 정비 L=5.81km 등 / 수혜면적:134.7ha
- 사 업 비 : 154.1억 원(국비 100%)
- 사업기간 : 2023 ~ 2028(예정)
- 시 행 자 : 한국농어촌공사(대상지 농어촌공사 관리구역)

□ 추진계획

- 세지지구 신규 배수장(1개소) 설치 및 배수로 정비(L=5.81km) 등을 통하여 저지대 농경지 침수 예방 및 농업기반시설 정비에 기여
- 추진 절차

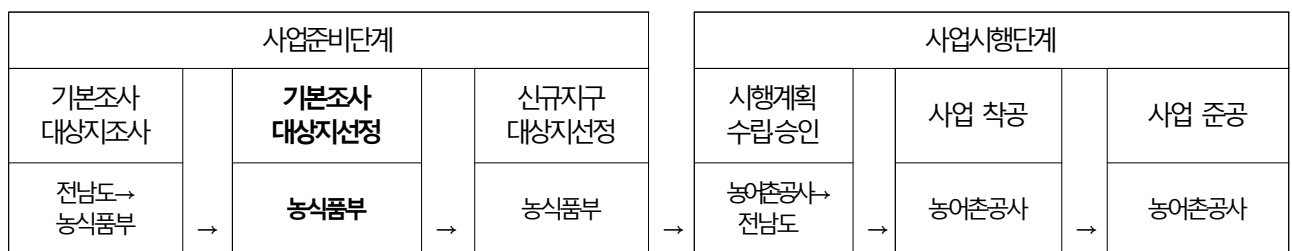

〈 연차별 추진일정 〉

[illegible]

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026 이후	
세지지구 배수개선 사업	총 계	15,410	0	15,410	0	100	200	2,192	12,918	-
	국 비	15,410		15,410	-	100	200	2,192	12,918	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행액	3,512	-	3,512	-	100	200	3,212	-	-

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 신규사업 대상지 보고(농어촌공사→나주시) : '19. 1.
- 배수개선 신규 대상지 제출(나주시→전남도) : '20. 4.
- 2022년도 배수개선사업 기본조사 대상지구 선정(농식품부) : '22. 6.
- 기본계획 추진(농어촌공사 나주시사) : '22. 7.
- 2023년도 배수개선사업 신규지구 선정(농식품부) : '23. 3.
- 세부설계 추진(농어촌공사 전남지역본부) : '23. 4.
- 2025년도 배수개선사업 예산 확보(3,212백만원) : '24. 12.
- 토지보상 착수 및 공사 착공 : '25. 1.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 12. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
사업 추진율	%	목표 (누계)	기본조사 지구선정	신규지구 선정	실시설계	사업추진율 (11%)	사업추진율 (20%)	100
		이행 (누계)	완료	완료	완료	사업추진율 (44%)		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

□ 기대효과

- 배수장 및 배수로 정비를 통한 농경지 침수피해 최소화
- 상습침수 농경지 배수개선을 통한 안전 영농 도모

주관부서	건설과	농업기반팀장 김의정	☎ 8901	주무관 한철희	☎ 8902
협조부서	한국농어촌공사	농어촌사업부장 정상문	☎ 330-9570	과 장 김원희	☎ 330-9550
